JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Tájékoztató

a Vármegyei Közgyűlésnek

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Önkormányzat 2014-2020 és 2021-2027 közötti időszakra szóló Integrált Területi Programjának végrehajtásáról és előrehaladásáról

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) pont szerint a vármegyei önkormányzat nyomon követi és értékeli a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területfejlesztési programok végrehajtását. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján a területi szereplő végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az Irányító Hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.

I. A TOP vármegyei végrehajtásával kapcsolatos általános tapasztalatok

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2014-2020 programozási időszak második felében a COVID-19, a gazdasági válság és a háborús helyzet következményeként a projektek egy részének megvalósítását a kivitelezési árak magas összege nehezítette. A lefolytatott közbeszerzési eljárások során a kedvezményezettek által kapott árajánlatok összegei helyenként meghaladták a Támogatási Szerződésekben rendelkezésre álló támogatási összegeket. Ilyen esetekben a kedvezményezettek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján többletforrás igénnyel fordultak az Irányító Hatóság (IH) felé és Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Önkormányzata felé. A projektek másik részében gondot jelentett, hogy több olyan kivitelező is jelentkezett a közbeszerzési eljárások során, amely cégek indokolatlanul alacsony összegekért kívánták a munkákat elvállalni. A jelenlegi szabályozás alapján nehéz volt kiszűrni azokat a kivitelezőket, akik nem reális áron kívánják elvállalni a munkákat, hogy utána viszont többletköltség igénnyel éljenek arra hivatkozva, hogy az árajánlatukban szereplő összeg nem elegendő a kivitelezési munkák befejezésére.

II. TOP forráskeretei és annak keretében benyújtott és elnyert támogatások

A TOP források végrehajtását az Integrált Területi Programok (ITP) alapozzák meg és segítik. A vármegyei önkormányzat a 2014-2020-as ITP módosítása kapcsán 12 esetben ülésezett. A 2014-2020-as időszakban a vármegyei közgyűlés által meghozott döntések és a meghirdetett felhívásokra beérkezett pályázatok statisztikái:

TOP felhívás száma	Felhívás címe	Beérkezett pályázatok száma (db)	Igényelt támogatás összege (Ft)	Hatályos TSZ száma (db)	Hatályos Támogatási Szerződések összege (Ft)	Kifizetések összege (Ft)
1.1.1-15	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	12	4 279 520 344	9	2 815 157 710	3 222 294 335
1.1.2-16	Inkubátorházak fejlesztése	2	491 841 283	2	450 863 383	491 738 239
1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés	18	1 402 193 388	10	782 266 538	1 040 711 422
1.2.1-15	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	23	6 793 857 625	19	4 568 647 615	5 897 454 886
1.3.1-15	Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés					
1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	43	5 652 301 803	35	4 645 947 058	4 697 004 974
1.4.1-19	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	34	7 827 947 768	29	6 453 220 014	6 784 321 740
1.5.1-20	A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	1	254 995 650	1	254 995 650	254 995 650
2.1.1-16	Barnamezős területek rehabilitációja					
2.1.2-15	Zöld város kialakítása	20	5 496 420 949	19	3 908 576 103	4 702 071 729
2.1.3-15	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	38	8 972 060 173	18	4 022 913 899	3 991 708 815
2.1.3-16	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	26	7 990 478 103	22	6 706 289 377	6 752 442 942
3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	29	7 240 842 946	22	4 766 253 715	4 902 666 076

3.2.1-15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	94	9 137 677 232	70	6 044 023 626	6 569 278 861
3.2.1-16	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	19	1 751 801 644	15	1 138 928 990	1 143 900 159
3.2.2-15	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	11	1 890 944 919	6	914 756 078	1 081 286 541
4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	32	2 432 244 936	23	1 804 212 126	1 805 597 058
4.2.1-15	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	41	3 785 814 743	27	2 415 541 123	2 675 410 248
4.3.1-16	Leromlott városi területek rehabilitációja	12	3 774 365 128	6	1 544 278 999	1 886 535 940
5.1.1-15	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1	1 986 938 522	1	1 986 938 522	2 021 057 480
5.1.2-16	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok					
5.2.1-15	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	10	1 298 958 979	8	1 074 684 945	1 115 402 396
5.3.2-17	Megyei identitás erősítése	1	444 998 980	1	444 998 980	444 998 980
	Összesen:	**467**	**82 906 205 115**	**343**	**56 743 494 451**	**59 675 281 413**

III. Az ITP-ben vállalt vármegyei eredmény indikátorok teljesülése

A vármegyei ITP-ben a vármegyének a megítélt forrásokhoz mérten eredményindikátorokat kellett vállalnia, melynek mérésére az Irányító Hatóság részéről 2024 novemberében kértünk tájékoztatást.

Az indikátorok teljesüléséből is látszik, hogy négy indikátor érték esetében nem sikerült teljesíteni az az Irányító Hatóság által a vármegyére rögzített értéket. A CO40 és a CO34 indikátor számok esetében nyílhat esély a pályázatok lezárását követően az indikátor értékek teljesüléséhez, míg a PO09 és a PO20 indikátorok esetében az ország által az Európai Bizottság felé vállalt értékekhez való hozzájárulás valósult meg.

Több indikátor érték teljesülésénél jelentősen emeltük a célérték eléréséhez az alapszámokat, mely a forráskihelyezés sikerességét támasztja alá.

Mindezeken túl az alábbi eredmények valósultak meg:

- Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében összesen 389 darab projekt került támogatásra 77,36 milliárd forint elszámolható összköltséggel, amely a vármegye 78 településének fejlesztéséhez nyújtott segítséget.

- A vármegyei 1.0 verziójú ITP forráskerete 53,78 Mrd Ft volt. A vármegye területére érkezett (Szolnok Megyei Jogú Város és JNSz vármegye) TOP forrásokból támogatott projektek száma: 659 db, összege: 98.327.062.669 Ft; ebből hatályos projekt: 658 db 94.019.504.502 Ft. Ebből közvetlenül települési önkormányzati kedvezményezetti projekt 416 db 91.408.286.617 Ft, a különbözet CLLD alapú (közösségi kedvezményezett) forrás.

A 2014-2020-as időszakban vármegyénkben valamennyi operatív programból megítélt forrás 430.088.030.037 Ft, 15.413 db hatályos projekttel lefedve.

- A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat pedig 4,57 milliárd forint támogatásban részesült, 4 nagy projekt keretében. Ezek között turisztikai, iparterület-fejlesztési, megyei identitás erősítése és foglalkoztatási, gazdasági együttműködések valósultak meg.

- A fejlesztések egyik kiemelt célja a gazdasági fejlődés erősítése volt, melynek részeként 57 új és fejlesztett ipari park 302,54 hektáron került fejlesztésre/bővítésre, segítve ezzel a vállalkozások betelepülését és bővülését.

- Az infrastruktúra fejlesztése révén 48,55 kilométer felújított úttal gazdagodott a vármegye a TOP forrásaiból. Kiegészülve 40,44 kilométernyi kerékpárúttal, így tudott a közlekedési hálózat korszerűsödni, megkönnyítve az áruszállítást és elősegítve a munkahelyek teremtését.

Közel 150 vállalkozás támogatása is meg tudott valósulni a TOP keretein belül. Mindezek eredményeként a foglalkoztatási paktumok keretében a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 4.213 fő volt és több mint 200 fő jutott álláshoz vármegyeszerte a TOP forrásaiból. Számos településen megvalósult, összesen 157 kilométernyi csapadékvíz elvezetési

rendszer fejlesztése is, valamint a zöld területek rehabilitációja, amelyek szintén hozzájárultak környezetünk megóvásához.

Népszerű projekteknek számítottak az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését támogató felhívásunk keretében megvalósult projektek, a vármegyében összesen 86 darab ilyen projekt zárt sikerrel, 7,2 milliárd forint összegű értékkel.

Számunkra kiemelten fontos, hogy a lakosok is büszkék legyenek otthonukra és ezért számos pályázatban nagy hangsúlyt kapott a közösségi terek megújítása, valamint a kulturális és sportlétesítmények fejlesztése. Ezek a projektek nem csupán az épített környezetet gazdagítják, hanem erősítik a közösségeinket, hiszen minden korosztály számára elérhetővé váltak az új és modern létesítmények.

A lakosság egészségének megőrzése és a szociális szolgáltatások színvonalának javítása szintén kulcsfontosságú volt. A TOP keretében több városban és faluban megújultak az orvosi rendelők, a szociális intézmények, valamint új szociális lakások is épültek a rászorulók támogatására. Ennek eredményeként 71.600 főnek javult az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése a vármegyében. Az oktatási beavatkozásaink révén is léptünk előre, hiszen új tantermek, informatikai eszközök, valamint digitális fejlesztések segítik a gyermekek és felnőttek oktatását.

Büszkék vagyunk arra, hogy ezzel hozzájárultunk a jövő generációjának sikereihez és versenyképességéhez. A TOP-os fejlesztések révén 647 gyermek jutott új bölcsődei férőhelyhez, 2.548 óvodai férőhely került fejlesztésre, 67 projekt által, több mint 12 milliárd forint támogatással tudtuk ezt megvalósítani.

TOP prioritás	Indikátor neve	Indikátor azonosítója	Mértékegysége	A megye által vállalt célérték (2023)*	A szerződéses állomány szerinti vállalási érték**	Teljesülési arány 2023-ra (%)**	A szerződéses állomány szerinti tényérték	Teljesülési arány (%)
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	PO01	ha	95,02	438,08	461%	302,54	318%
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	CO14	km	23,51	48,55	207%	48,55	207%
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	PO20	db	992	567	57%	527	53%
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	CO38	m^2	88 304,92	182 549,82	207%	183 679,87	208%
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	PO09	km	44,79	47,35	106%	40,44	90%
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	CO34	tonna CO_2 egyenérték	6 986,34	5 378,54	77%	5 305,66	76%
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó	PO10	db	59	105	178%	106	180%

	ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma							
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	CO40	lakóegység	18	19	107%	17	96%
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	PO25	fő	1 963	3 625	185%	4 213	215%
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	PR29	fő	8 460	59 981	709%	82 767	978%

IV. TOP projektek zárása

Az Irányító Hatóság által kapott tájékoztatás alapján a TOP-ból támogatott 6.509 projektből 6.036 projekt került zárásra – 445 db zárása folyamatban van. A projektek zárását akadályozó tényezők az engedélyek beszerzése, az esetleges szabálytalansági eljárásokból eredő követelések megfizetése, a záró beszámolók és záró kifizetési igénylések teljes körű hiánypótlásának hiánya.

A TOP forrásokból támogatott projektek zárása vármegyénként:

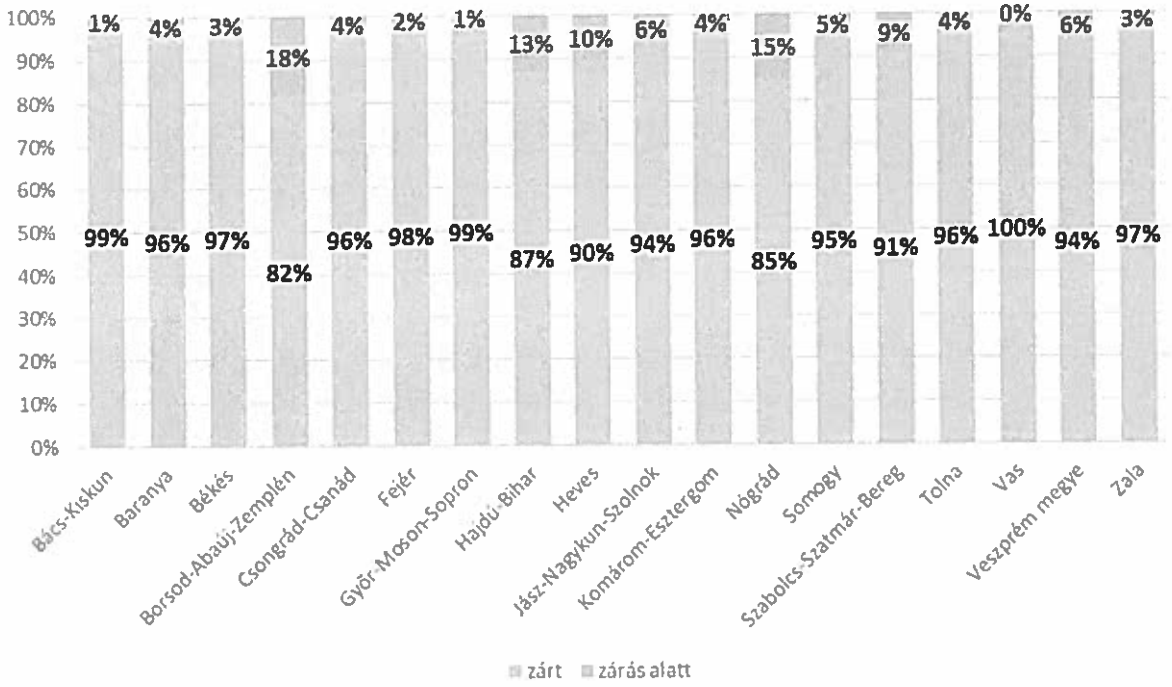

Vármegyénkben a 6,0 %-os zárás alatti állomány 25 projektet foglalt magában 2024. november közepén (ezen projektek összege 8,71 Mrd forint), ez jelenleg már 20 projektre redukálódott.

A projektek zárásáról 2025. február 15-ig kell gondoskodni.

V. TOP_Plusz vármegyei forráskeret

- **A 2021-2027 Európai Uniós fejlesztési ciklus ideiglenes Jász-Nagykun-Szolnok (Vár)Megyei Integrált Területi Programjához delegált forráskerete 88,752 Mrd Ft volt. A megyei önkormányzat tervezési területéhez tartozó 64 településre (Szolnok és várostérsége kivételével) jutó forráskeret 65.330.347.200 Ft. A 2022-es évben két benyújtási határnappal meghirdetésre került a megyei forráskeret 92,8 %-a (60.671.979.517 Ft).**

- A jogszabályi háttér változása miatt újabb forráskeretek vármegyei delegálására került sor, így 2023. április 03-ai vármegyei Közgyűlésen elfogadott JNSz Vármegyei Területi Program 2.0 forráskerete 97.347.000.000 Ft lett, ebből a vármegyei önkormányzat

tervezési területére jutó forrás 70.995.412.562 Ft, míg Szolnok Megyei Jogú Város és térsége 26.351.587.438 Ft közvetlen kerettel bír. A vármegyei teljes forráskeretből ERFA (infrastrukturális, beruházási irányú) forrás 85.572.000.000 Ft, míg ESZA (foglalkoztatást elősegítő, valamint a gazdasági és szociális kohéziót előmozdító pénzügyi eszköze) kerete 11.775.000.000 Ft.

- A vármegyei keret ITP 4.0 szerinti **elvi megosztása** a következő (**milliárd forintban**):

Térkategóriák között a forrásfelhasználási módok szerint:

Fenntartható városfejlesztés (28,32 %) (27,567 milliárd Ft) forrásfelhasználási mód:

- TK1 Szolnok Megyei Jogú Város és településegyüttes (14 település): 28,32 % (27,567 milliárd Ft)

Fejlesztési célterület (50,25 %) (48,916 milliárd Ft) forrásfelhasználási mód:

- TK2 Jászberény térsége (10 település): 7,97 % (7,762 milliárd Ft)
- TK3 Törökszentmiklós térsége – Mezőtúr térsége – Kunszentmárton térsége (23 település): 14,98 % (14,590 milliárd Ft)
- TK4 Karcag térsége – Tiszafüred térsége (14 település): 11,15 % (10,857 milliárd Ft)
- TK5 Kunhegyes térsége (7 település): 5,65 % (5,502 milliárd Ft)
- TK6 Jászapáti térsége (10 település): 7,55 % (7,350 milliárd Ft)
- Aktív turizmus fejlesztési célterület: 2,93 % (2,855 milliárd Ft)

Kiemelt Kedvezményezettek (21,43%) (20,861 milliárd Ft) forrásfelhasználási mód:

- Magyar Közút Zrt. projektjei: 14,02 % (13,650 milliárd Ft)
- Vármegyei Önkormányzat projektje: 3,99 % (3,891 milliárd Ft)
- Vármegyei tankerületek projektje: 3,05 % (2,97 milliárd Ft)

Így a Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási módon a vármegyére dedikált források kicsivel több, mint a 28,32 %-a kerül felhasználásra, a Fejlesztési célterületekre és a Kiemelt kedvezményezettek forrásfelhasználási módokra pedig összesen 71,68 % jut, utóbbiból 13,2 % kerül felhasználásra a két komplex programmal kezelendő Jászapáti járásban és Kunhegyesi járásban.

A Fejlesztési célterület forrásfelhasználási módra allokált forrás
- jelentős része a Jászberény térsége és Jászapáti térsége, illetve Karcag térsége – Tiszafüred térsége és Kunhegyes térsége térkategóriákon kerül felhasználásra,
- 14,98 %-a jut a Törökszentmiklós térsége – Mezőtúr térsége – Kunszentmárton térsége térkategóriára

- **A benyújtott pályázatok kapcsán tíz alkalommal ülésezett a megyei/vármegyei közgyűlés.** A megyei forráskeret 78 %-a meghirdetése mellett a forráskeret 73,5 %-a került kitámogatásra (204 db pályázat / 53.809.001.879 Ft) egyhangúan a vármegyei képviselők által. A benyújtott támogatási kérelmek száma 284 db volt, ebből IH által támogatott projekt 210 db volt. A támogatott projektekből 204 db került megkötésre és 202 projekt esetében a források kihelyezése is megvalósult.

- **Az ITP térkategória szerint tervezési területünkhöz tartozó 64 db település közül 62 db-ra érkezett már TOP_Plusz forrás.** A cél hasonlóan a TOP forráskereteknél tervezett szerint, hogy végül minden tervezési területünk szerinti települési önkormányzat részesedjen a vármegyei forráskeretből. Nem érkezett forrás: Jászivány és Tiszainoka Község Önkormányzatához.

TOP_Plusz kötelezettségvállalás vármegyénként (2014.10. hó)

Vármegye	Váregyei forráskeret FVS nélkül (Mrd Ft)	Támogatott projektek (FVS nélkül)		FVS keret (Mrd Ft)
		Mrd Ft	%	
Bács-Kiskun	83,77	56,73	68%	24,06
Baranya	60,56	38,65	64%	33,34
Békés	72,39	57,26	79%	22,40
Borsod-Abaúj-Zemplén	118,00	94,35	80%	32,35
Csongrád-Csanád	60,58	43,19	71%	51,75
Fejér	50,90	29,43	58%	22,88
Győr-Moson-Sopron	43,84	31,45	72%	26,43
Hajdú-Bihar	83,96	68,41	81%	43,36
Heves	61,18	53,80	88%	11,91
Jász-Nagykun-Szolnok	69,78	54,31	78%	27,57
Komárom-Esztergom	34,81	28,69	82%	18,81
Nógrád	52,98	43,43	82%	18,68
Pest	166,78	141,42	85%	4,50
Somogy	63,69	48,72	76%	15,05
Szabolcs-Szatmár-Bereg	113,50	88,96	78%	52,80
Tolna	27,70	18,86	68%	24,69
Vas	35,88	25,60	71%	13,45
Veszprém	55,95	38,25	68%	24,30
Zala	29,02	25,08	86%	32,30
Összesen	**1285,28**	**986,58**	**77%**	**500,61**

Vármegyei döntések bemutatása
(TOP_Plusz 3.3.3; TOP_Plusz-6.1.4 forráskeretek nélkül)

TOP Plusz felhívás száma	Felhívás címe	Beérkezett pályázatok száma (db)	Igényelt támogatás összege (Ft)	Hatályos TSZ száma (db)
1.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztése	27	7 169 482 593	25
1.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	21	5 742 853 381	17
1.2.1-21	Élhető települések	33	11 152 234 228	32
1.2.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	4	615 999 970	3
1.2. 3-21	Belterületi utak fejlesztése	55	6 323 830 950	47
1.3.1-21	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	1	80 000 000	1
2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	52	7 803 264 233	41
3.1.1-21	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés	1	3 891 999 997	1
3.1.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	6	669 149 683	6
3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	19	1 698 414 623	11
3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	17	1 550 402 836	15
6.1.2-21	4-5 számjegyű utak fejlesztése			
Összesen:		**236**	**46 697 632 494**	**199**

TOP_PLUSZ támogatott projektek előrehaladása
Kedvezményezettek 2024. szeptemberi adatszolgáltatás alapján, megoszlás darabszám alapján
FVS nélkül

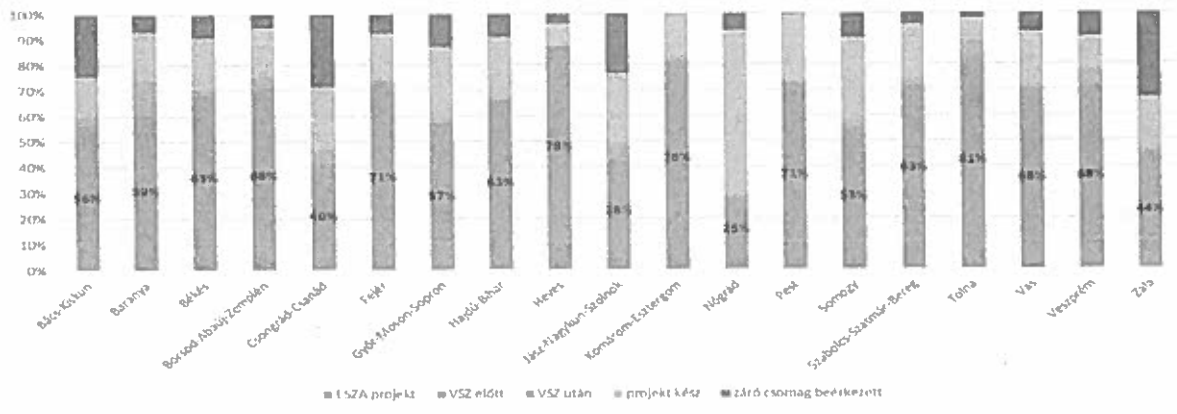

VI. TOP_Plusz indikátorok teljesülésének állása

Prioritási tengely	Indikátor		Mérték-egység	Mérföldkő 2024 (Országos)	Célérték 2029 (Országos)	Vármegye által vállalt célérték (2029)	Hatályos TSZ állomány szerinti vállalási érték*
	Azonosító	Megnevezés					
TOP_Plusz-1	TPO12	Megvalósított megyei szemléletformáló és tudatosságnövelő programok száma	db	0	19	0	0
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	7	70,85	5,99	5,41
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	0	149 838	10 415	3 300
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	21,34	426,88	14,95	5,32
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	0	1 890 047	66 158	280 250
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	0	6,90	0	0
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	7	68	0	3
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	79 336	0	43 564
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	117 686	1 176 865	81 796	16 529
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	0	829	83	8
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	0	125	13	0
TOP_Plusz-1	RCO46	Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	13,19	131,86	9,350	48,93
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	42 085,39	420 853,85	23 131,17	39 955,00
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások	CO2t/év	0	36 582,11	2 010,65	1 655,52
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	0	63 128	3 469,68	227,83
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	1,94	19,40	1,07	42 284,59
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	0	21 340	1 171,90	234,78
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	11	1,00	0
TOP_Plusz-3	TPO05	Programban résztvevő munkanélküliek száma	fő	1 766	35 320	1 957	2 137

TOP_Plusz-3	TPO06	Programban résztvevő inaktív személyek száma	fő	207	4 144	230	251
TOP_Plusz-3	TPO23	Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma	fő	128	2 567	143	143
TOP_Plusz-3	TPO24	Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma	fő	2 168	43 362	2 402	2 402
TOP_Plusz-3	TPR02	Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma	fő	nem releváns	22 258	1 233	1 347
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.2)	db	0	255	16	52
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	0	127	8	1
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.2)	fő	nem releváns	13 716	817	930
TOP_Plusz-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	0	188	12	0
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.3)	db	9	901	18	52
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	3	338	7	0
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.3)	fő	0	1 540 056	29 532	930
TOP_Plusz-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	0	97	2	0
TOP_Plusz-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	0	4 408	89	961
TOP_Plusz-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	359	3 591	96	84
TOP_Plusz-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	93	932	25	0
TOP_Plusz-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2 032	20 320	352	150
TOP_Plusz-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	75	752	14	0

TOP_Plusz-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	0	42	2	0
TOP_Plusz-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	0	160	3	1
TOP_Plusz-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	56	559	18	12
TOP_Plusz-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	0	4 018 502	126 831	90 000
TOP_Plusz-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	26	255	7	29
TOP_Plusz-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	0	185	6	2
TOP_Plusz-3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	0	32	1	1
TOP_Plusz-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	0	26 086	1 425	0
TOP_Plusz-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	0	248	14	0
TOP_Plusz-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	0	6	1	0
TOP_Plusz-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	0	18 782	1 026	0
TOP_Plusz-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	117	1 179	117	113
TOP_Plusz-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	12	120	12	0
TOP_Plusz-6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	0	83	9	6
TOP_Plusz-6	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	26,97	269,75	23,71	26,36
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.3)	db	27	216	13	17
TOP_Plusz-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	11	1	1

TOP_Plusz-6	TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma (6.1.3)	db	0	3	1	0
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.4)	db	0	162	9	0
TOP_Plusz-6	TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma (6.1.4)	db	0	5	1	0
A mérföldkő- és célérték-adatok forrása a 1196/2023. (V. 15.) Korm. Határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló integrált területi programok elfogadásáról. *A szerződéses projektállomány vállalásai alapján számított előrejelzés a 2024.11.01-i EUPR lekérdezés adatai alapján.							

A TOP-Plusz fejlesztési keret megalapozott kihelyezését segítette TOP forrásból 49 darab pályázat előzetes kidolgozása, valamint az AOFK (Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ) támogatásából térségi kerékpárutak terveinek elkészülte.

A TOP-Plusz fejlesztések keretében eddig **17 turisztikai projekt** kapott támogatást, **33 db projekt** keretében valósul meg **település/településközpont fejlesztés, 48 db pályázat keretében belterületi utak felújítására kerül sor, 41 db projekt** keretében pedig **önkormányzati épületek energetikai felújítása. Gyermeknevelést segítő épületek felújítását 14 db nyertes projekt** segíti, míg **egészségügyi épületek fejlesztését és energetikai felújítását 16 db projekt. 1 db vármegyei foglalkoztatási paktum projekt fut** és **4-5 számjegyű utak fejlesztésére 13,6 milliárd forint összegben 3 db nyertes projekt kapott támogatást**. További jelentős forrás került kiírásra **aktív turisztikai, köznevelési intézmények és helyi humán fejlesztésekre**.

Forrás ráemelési kérelmet eddig 7 projekt esetében nyújtottak be összesen közel **176 millió Ft** értében. Ezek elbírálása még folyamatban van.

A Vármegyei Területfejlesztési Ügynökségnek jelentős koordinatív szerepe van a TOP- és TOP-Plusz forrásokból megvalósuló projektek beruházásának megvalósításában, a források szabályszerű lehívásában és elszámolásában.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót vitassa meg és hozza meg döntését.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés …./2024. (XII.10.) számú határozata Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Önkormányzat 2014-2020 és 2021-2027 közötti időszakra szóló Integrált Területi Programjának végrehajtásáról és előrehaladásáról

A Vármegyei Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Önkormányzatának a 2014-2020 és 2021-2027 közötti időszakra szóló Integrált Területi Programjának végrehajtásáról és előrehaladásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Erről:

1) Vármegyei Közgyűlés tisztségviselői
2) Vármegyei főjegyző
3) Irodavezetők

értesülnek.

Szolnok, 2024. december 03.

Hubai Imre

Készítette:
.....
Páldi Tamás Attila
irodavezető
Térségfejlesztési és Külügyi Iroda

Ellenőrizte:
.....
Dr. Molnár Zoltán
vármegyei aljegyző, irodavezető
Közgyűlési és Pénzügyi Iroda

Határozati javaslat törvényes:
.....
Rentzné Dr. Bezdán Edit
vármegyei címzetes főjegyző
